

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП


Комплексен План-трафик за изпълнение на поръчката

№	С МР/Материални	Отговорен експерт	Механизация	Обюто дни
I	Изграждане и предаване на проектна документация			
1	Избриване от лист на място за лабораторие, бюрата и лестайки на проекта	E1, E2, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14	M1	30
2	Изграждане на проект по Част 1: Видоизменение	E1, E2, E7, E8, E9	M1	2
3	Изграждане на проект по Част 2: Технорештестване	E1, E10	M1	6
4	Изграждане на проект по Част 3: Сигурностно-охранителна система и периметрова охранителна	E1, E11	M1	6
5	Изграждане на проект по Част 4: Сигурностно-охранителна система и периметрова охранителна	E1, E12	M1	6
6	Изграждане на проект по Част 5: Проектно-сметна документация (ПСД)	E1, E13	M1	5
7	Изграждане на проект по Част 6: Гари за безопасност и здраве (ИГЗ)	E1, E14	M1	4
8	Предаване на проектната документация за разпитване и съдоврение от Видоизменения	E1	M1	1
II	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на всички системи част от обекта на подрядчика	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M2, M3, M4, M5	30
1	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M2, M3, M4, M5	8
1.1	Доставка на оборудване за видеонаблюдение на ОРУ 110kV и ЗРУ 6/10/20kV	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M2	1
1.2	Полагане на PVC тръбни канали	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
1.3	Полагане на кабелите в подгответите трасета	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M5	1
1.4	Монтаж на видеонаблюдение на стадион/стадион	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M5	1
1.5	Монтаж на комуникационен шкаф, UPS-и, зар. Габю, UPS и работна станция	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M5	1
1.6	Спасяване на всички оптични свръзки	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M2, M3, M4, M5	8
1.7	Настройка на системата	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M4, M5	1
1.8	Предварителни тестове	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
1.9	Финален 72 часов тест на всички системи	E1, E2, E3, E4, E7	M1	3
2	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на видеонаблюдение по периметъра на обекта	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M2	1
2.1	Доставка на оборудване за видеонаблюдение по периметъра на обекта	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M3, M5	1
2.2	Направа на иконки за тръбопроводи и обратни насипи	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.3	Изграждане на оптични и закръвняващи кабели	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.4	Направа на оптични и закръвняващи кабели за видеонаблюдение	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.5	Монтаж на стойка за видеонаблюдение	E1, E2, E3, E4, E6, E7	M1, M5	1
2.6	Монтаж на комуникационен шкаф на стълба	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M5	1
2.7	Монтаж на камери за видеонаблюдение	E1, E2, E3, E4, E5, E7	M1, M5	1
2.8	Инсталиране на софтуер за видеонаблюдение към доставленото оборудване (NVR-и, зар. Tablo, UPS и работна станция)	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.9	Спасяване на всички оптични свръзки	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M4, M5	1
2.10	Настройка на системата	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.11	Предварителни тестове	E1, E2, E3, E4, E7	M1, M5	1
2.12	Финален 72 часов тест на всички системи	E1, E2, E3, E4, E7	M1	3
3	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в обекта	E1, E2, E3, E4, E5, E8	M1, M2, M5	8
3.1	Доставка на оборудване за пожароизвестителна система	E1, E2, E3, E4, E8	M1, M2	1
3.2	Полагане на PVC тръбни канали	E1, E2, E3, E4, E8	M1, M5	1
3.3	Полагане на кабелите в подгответите трасета	E1, E2, E3, E4, E8	M1, M5	1
3.4	Монтаж на оборудване за пожароизвестителна система в обекта	E1, E2, E3, E4, E5, E8	M1, M5	1
3.5	Инсталиране на софтуер за пожароизвестителна система към доставленото оборудване (NVR-и, зар. Tablo, UPS и работна станция)	E1, E2, E3, E4, E5, E8	M1, M5	1
3.6	Настройка на системата	E1, E2, E3, E4, E8	M1, M5	1
3.7	Предварителни тестове	E1, E2, E3, E4, E8	M1, M5	1
3.8	Финален 72 часов тест на всички системи	E1, E2, E3, E4, E8	M1	3
4	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сигнализационна и ограничителна система	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M2, M3, M5	8
4.1	Доставка на микроръчни барирни и закръвняващи блоки	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M2	1
4.2	Направа на иконки за стригателно-охранителна система и периметрова охранителна	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M3, M5	1
4.3	Изграждане на комуникационни и закръвняващи кабели	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.4	Монтаж на стойка за микроръчни барирни	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.5	Монтаж на микроръчни барирни и закръвняващи блоки	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.6	Монтаж на сконките по периметър (магнитни и PIR сензори)	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.7	Полагане на PVC тръбни канали в страдите	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.8	Полагане на кабелите в подгответите трасета	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.9	Монтаж на оборудване за сигнализационна и ограничителна система	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.10	Инсталиране на софтуер за сигнализационна и ограничителна система към доставленото оборудване (NVR-и, зар. Tablo, UPS и работна станция)	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.11	Настройка на системата	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.12	Предварителни тестове	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1, M5	1
4.13	Финален 72 часов тест на всички системи	E1, E2, E3, E4, E5, E9	M1	3

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП



Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

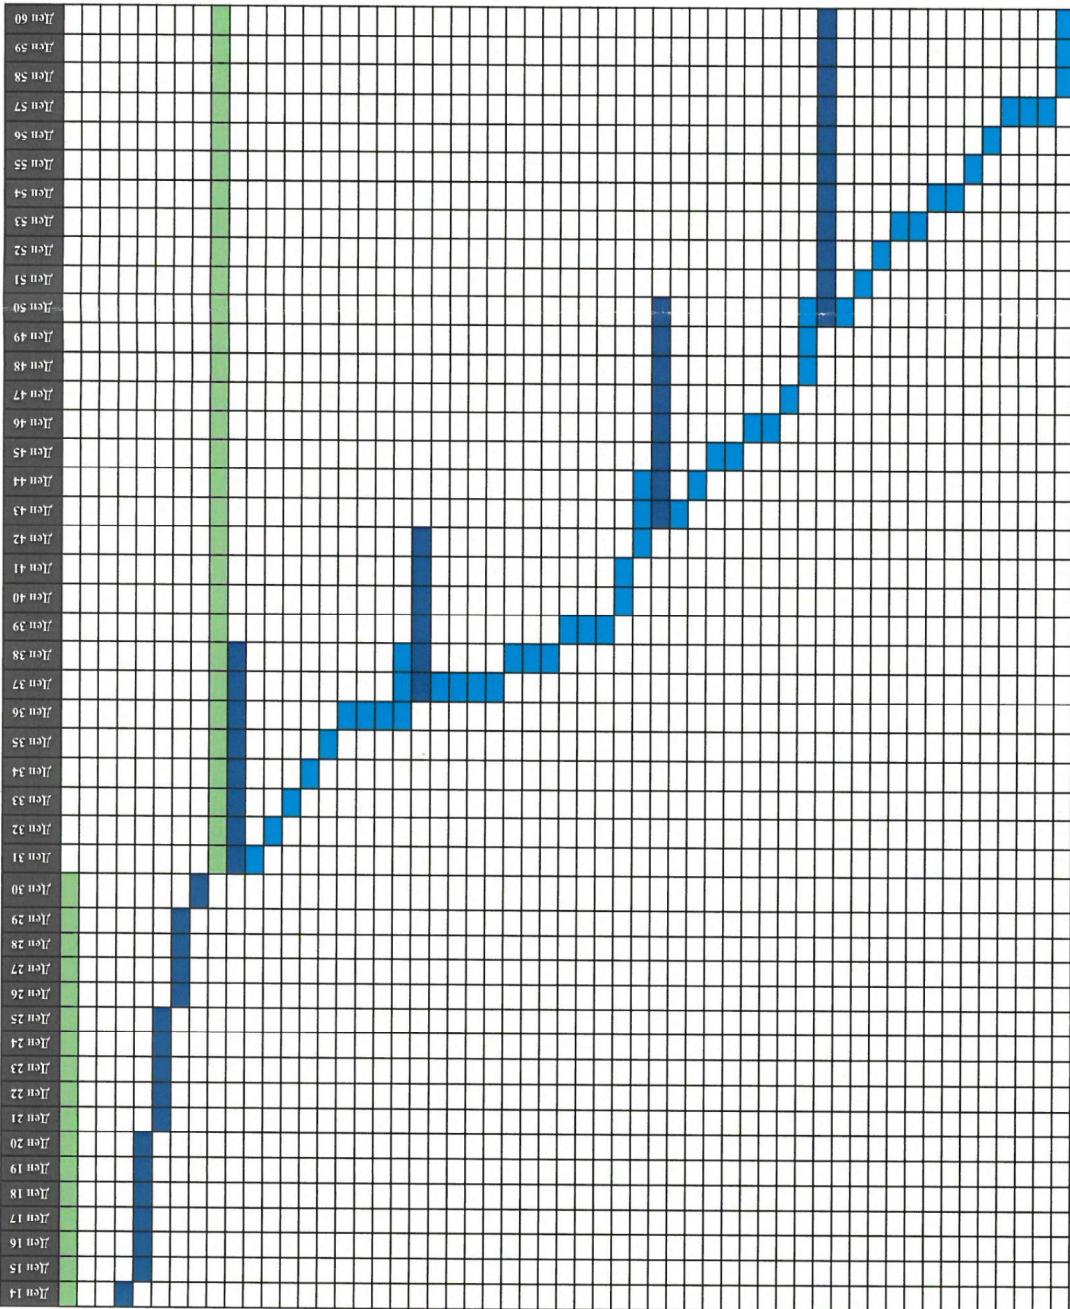

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

0000025

